


# Monitoramento PDTIC

## Iniciativas

Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾

Iniciativas Previstas no Período

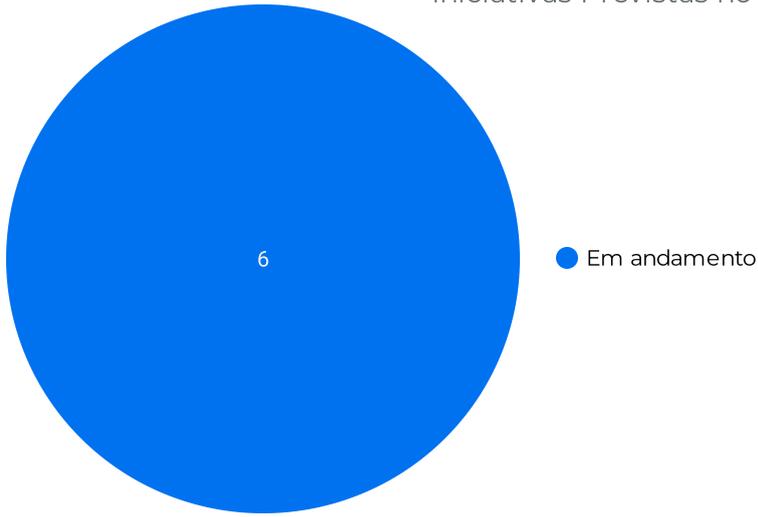


6

● Em andamento

### Ações Concluídas No Período

Unidade	Prazo	Conclusão
Não há dados		

Concluído no período

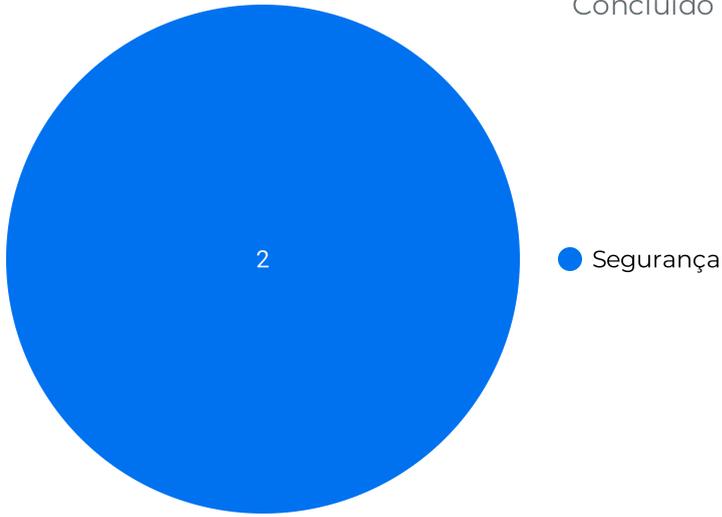

2


● Segurança

### Ações previstas para o período e não concluídas

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade
INF-29	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	NAT
PTE-57	Revisar a metodologia de gestão de processos	NIC
INF-27	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	SEDIN
CORP-18	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	COSIN
PTE-42	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	SEDIN
CORP-12	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	SEMDU

1 - 6/6 < >

PDTIC 2021-2026

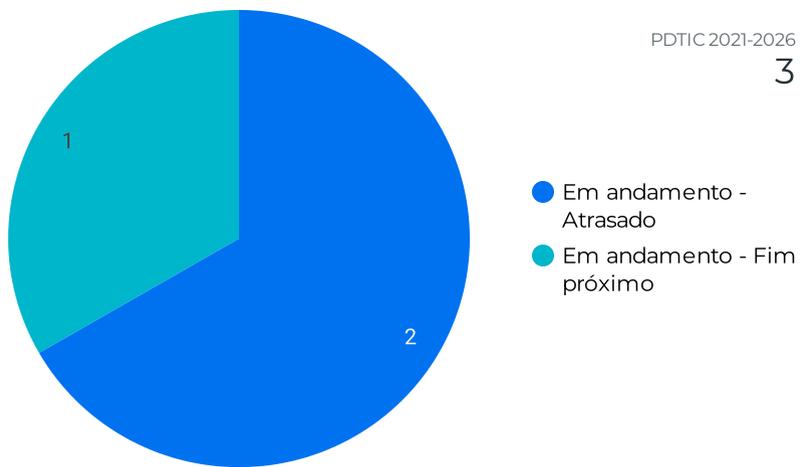

3

● Em andamento - Atrasado  
● Em andamento - Fim próximo


Histórico de ações concluídas do PDTIC



# Monitoramento PDTIC

Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾

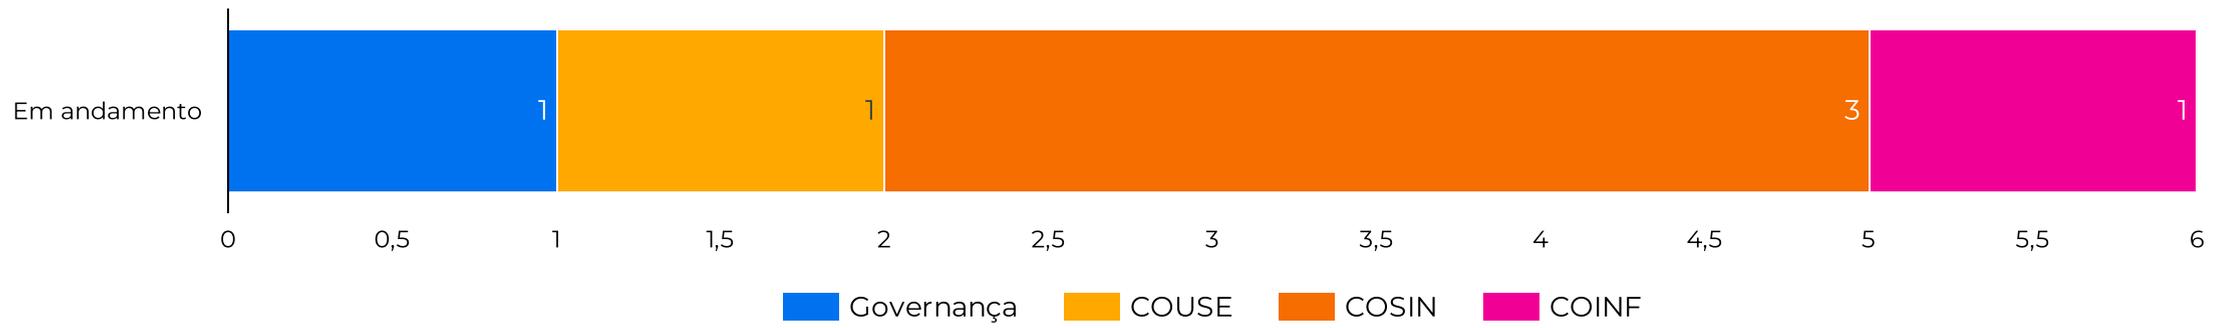


ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa	Fase
PTS-17	Elaborar norma tática de Uso Aceitável de Recursos de TI	SESEC	mai. de 2024	13 de jun. de 2024	Concluído
PTS-20	Elaborar norma tática de Uso de Recursos Criptográficos	SESEC	mai. de 2024	13 de jun. de 2024	Concluído

# Monitoramento PDTIC COSIN

Área


1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024

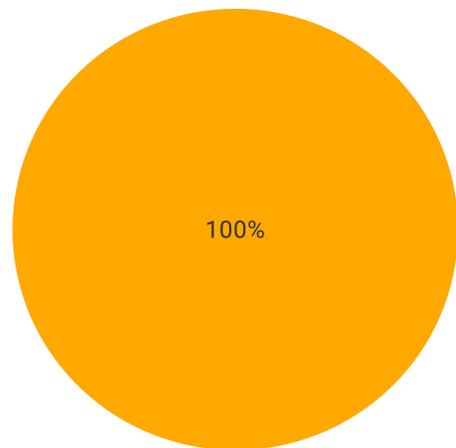

Iniciativas Previstas no Período

3

● Em andamento - Atrasado




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-27	Demanda interna	Realizar melhorias de segurança no Sistema Guardião	API de integração com o Duo criada. Falta alterar o código da página de login	SEDIN	jun. de 2024	Em andamento - Atrasado
PTE-42	Art. 17, §1 e § 2	Elaborar, aplicar e divulgar pesquisas de satisfação sobre os serviços disponíveis no canal digital	Publicado em : <a href="https://www.tre-ma.jus.br/institucional/ouvidoria/Aaa_Relatórios_e_Resoluções">https://www.tre-ma.jus.br/institucional/ouvidoria/Aaa_Relatórios_e_Resoluções</a>	SEDIN	jun. de 2024	Em andamento - Atrasado
CORP-18	Demanda interna	Implementar ferramenta para sugerir quantidade máxima de eleitores por seção e agregação de seções	Egídio - Conduzindo a parte da IA Glacy - Conduzindo a parte de dados	COSIN	jun. de 2024	Em andamento - Atrasado

# Monitoramento PDTIC COINF

Área ▾


1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾

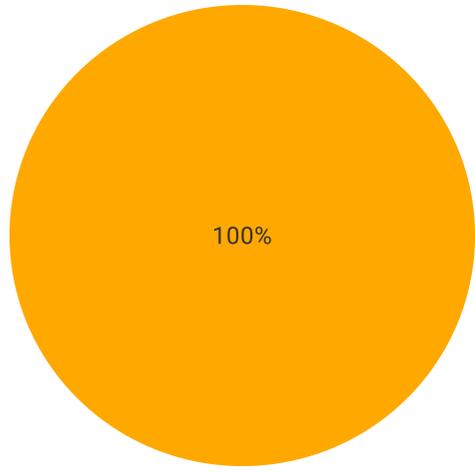

Iniciativas Previstas no Período

1

● Em andamento - Atrasado




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
INF-29	Demanda interna	Substituição de equipamentos obsoletos nas ZEs e Secretaria do Tribunal e recomposição da reserva técnica	Encaminhamos o Relatório de Conclusão de Manutenção Preventiva 2024, conforme registrado no documento nº 2243816. Com o envio deste relatório, informamos que todas as atividades de manutenção preventiva do parque de computadores dos cartórios eleitorais foram concluídas com sucesso para o ano de 2024.	NAT	jun. de 2024	Em andamento - Atrasado

# Monitoramento PDTIC COUSE

Área

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024

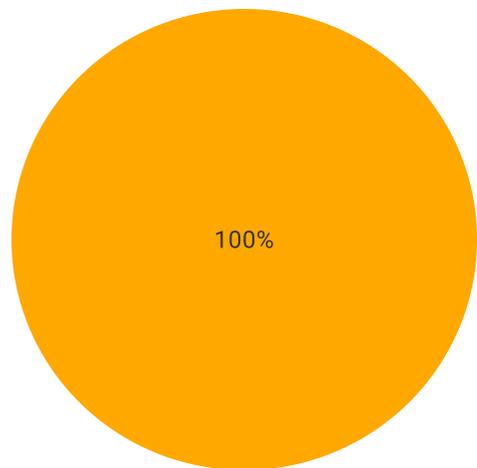

Iniciativas Previstas no Período

1

● Em andamento - Atrasado

■ Histórico de ações concluídas do PDTIC




ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo	Status
CORP-12	Demanda interna	Elaborar um relatório detalhado sobre logística de urnas visando atender o tempo limite de 22h para transmissão	Na reunião de 25/07 foi informado que esse relatório já foi elaborado e está sendo trabalhado para Eleições 2024.	SEMDU	30 de jun. de 2024	Em andamento - Atrasado

# Monitoramento PDTIC

## Governança

Área


1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024

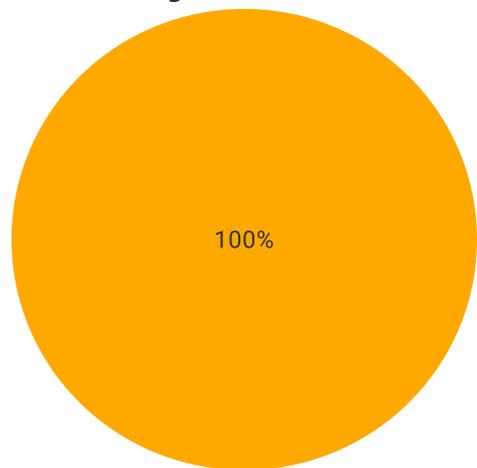

Iniciativas Previstas no Período

1

● Em andamento - Atrasado



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
PTE-57	ENTIC-JUD	Revisar a metodologia de gestão de processos	Ação impactada por outras prioridades, especialmente o Sistema Nacional de Conformidade, inicialmente não previsto, bem como novos painéis para Ranking da Transparência. Previsão de conclusão: Junho/24	NIC	jun. de 2024	Em andamento - Atrasado

# Monitoramento PDTIC Segurança


Área ▾

1 de jun. de 2024 - 30 de jun. de 2024 ▾

Iniciativas Previstas no Período

0

Não há dados



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade	Prazo Final	Status
----	--------	--------------------------------	-------------	---------	-------------	--------

Não há dados
