

Monitoramento PDTIC


Iniciativas

Área

1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

6

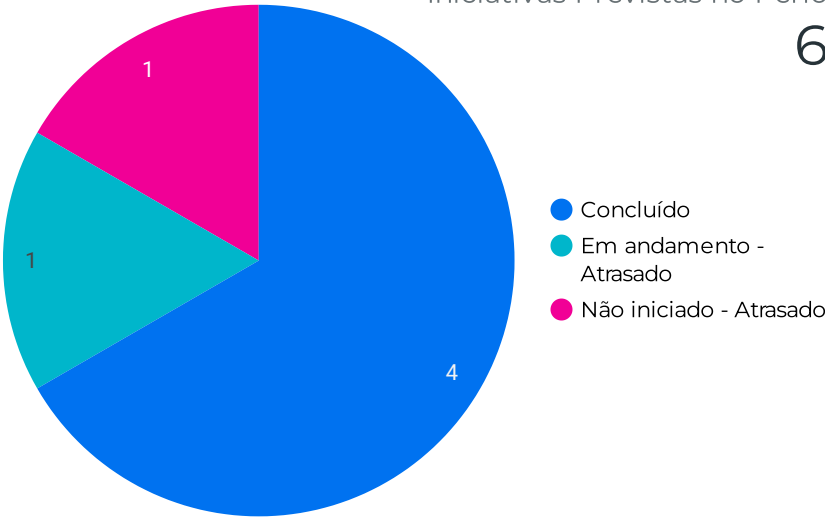

- Concluído
- Em andamento - Atrasado
- Não iniciado - Atrasado


Ações Concluídas No Período

	Unidade	Prazo	Conclusão
Implantar ferramenta para contagem de impressões	COSIN	set. de 2023	1 de mar. de 2023
Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos	SESUM	set. de 2023	23 de jun. de 2023
Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	COSIN	set. de 2023	3 de out. de 2023
Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais	COUSE	set. de 2023	31 de jul. de 2023

1 - 4 / 4

Concluído no período

2

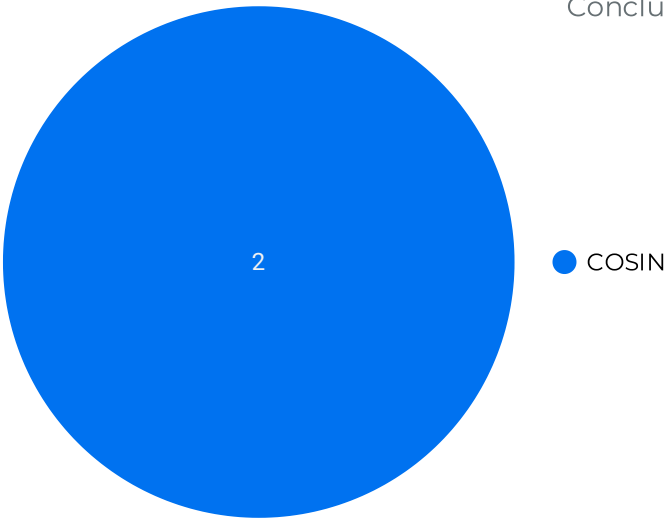

- COSIN

Ações previstas para o período e não concluídas


ID		Unidade
PTE-46	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	NIC
PTE-60	Evolução do Processo de Contratações de TIC	NIC

1 - 2 / 2

PDTIC 2021-2026

167


- Concluído
- Em andamento - No prazo
- Em andamento - Atrasado
- Cancelado
- Deveria ter iniciado
- Não iniciado - No prazo
- Não iniciado - Atrasado
- Em andamento - Fim próximo

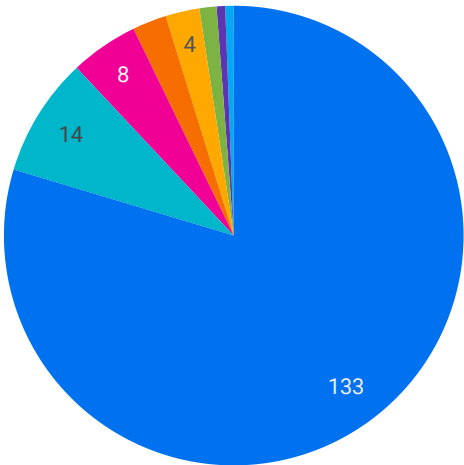

Histórico de ações concluídas do PDTIC

Ações Concluídas


133

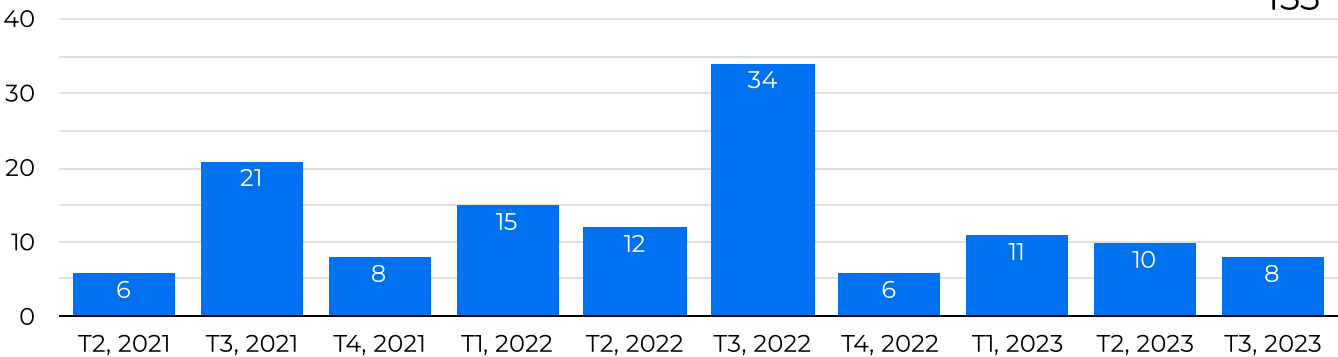

Monitoramento PDTIC

Área ▾

1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023 ▾

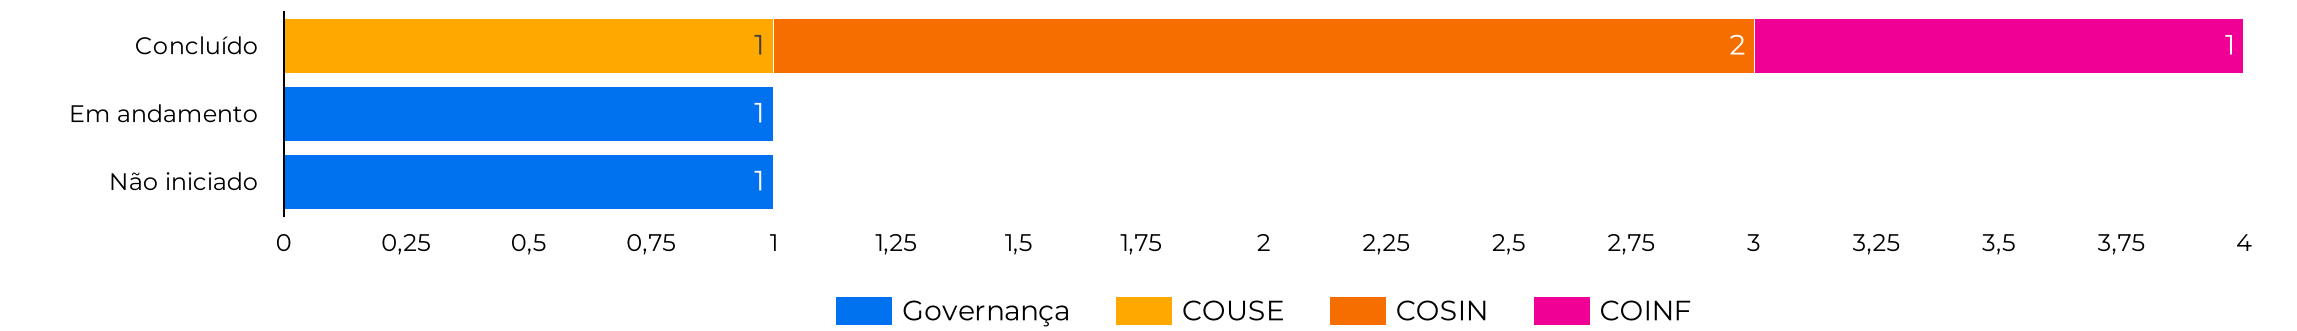


ID da Ação	Descrição das Ações	Unidade	Prazo (Ano e mês)	Concluído em dd/mm/aa 1 ▲	Fase 2 ▼
PTD-07	Sistema único para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar IGOVTIC, IGG do TCU, compras do TRE	COSIN	jun. de 2023	15 de set. de 2023	Concluído
CORP-10	Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas	SESJU	out. de 2023	18 de set. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

COSIN


Área ▾

1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023 ▾

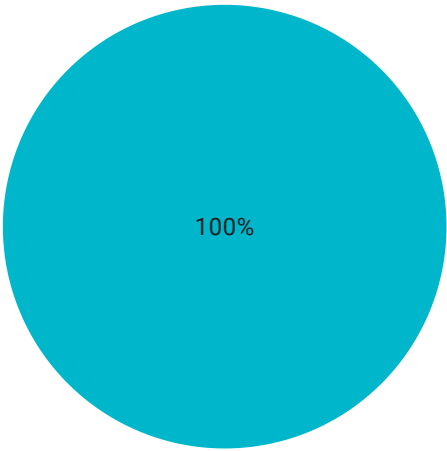

Iniciativas Previstas no Período
2

● Concluído

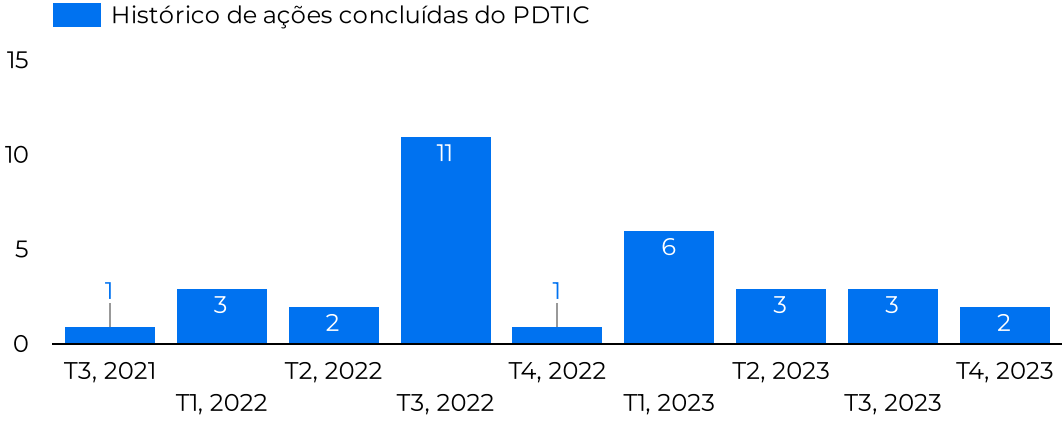


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ② ▾	Prazo Final	Status
CORP-14	PLS	Implantar ferramenta para contagem de impressões	-	COSIN	set. de 2023	Concluído
CORP-17	Demanda interna	Realizar estudo para monitoramento de rotas de logística de urnas via GPS	Dezenas de softwares no mercado fazem o solicitado, inclusive com vantagens para a Logística	COSIN	set. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

COINF

Área


1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023

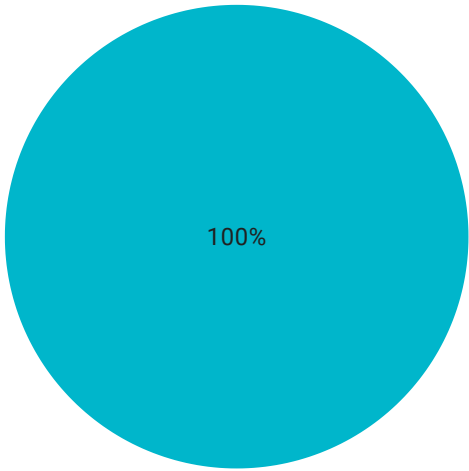

Iniciativas Previstas no Período

1

● Concluído

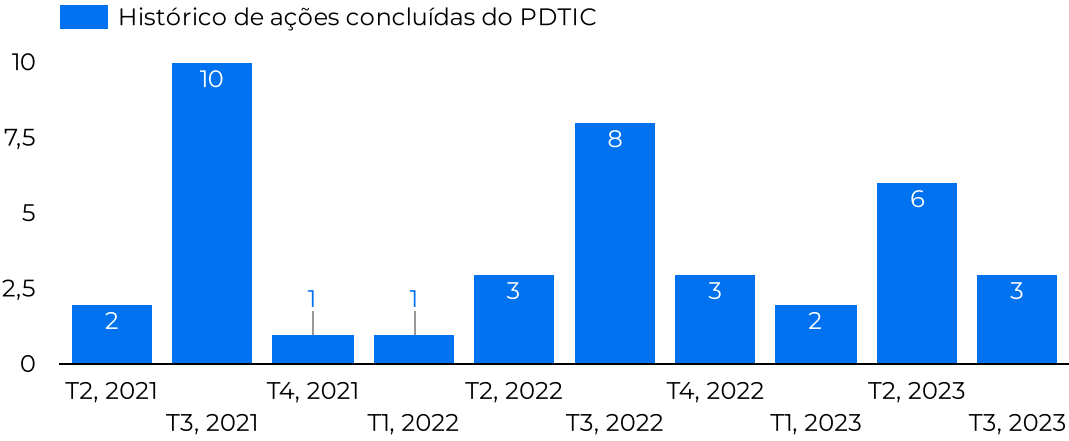


ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final	Status
INF-25	Demanda interna	Melhorar a infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais que possuem switches antigos	Susbstituições de switches nas ZEs, durante a visitas técnicas para preparação da biometria.	SESUM	set. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

COUSE

Área


1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023

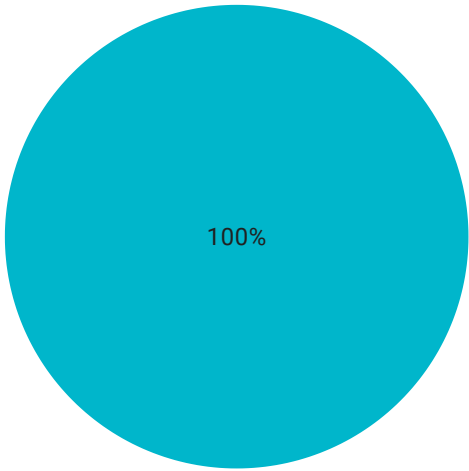

Iniciativas Previstas no Período

1

● Concluído

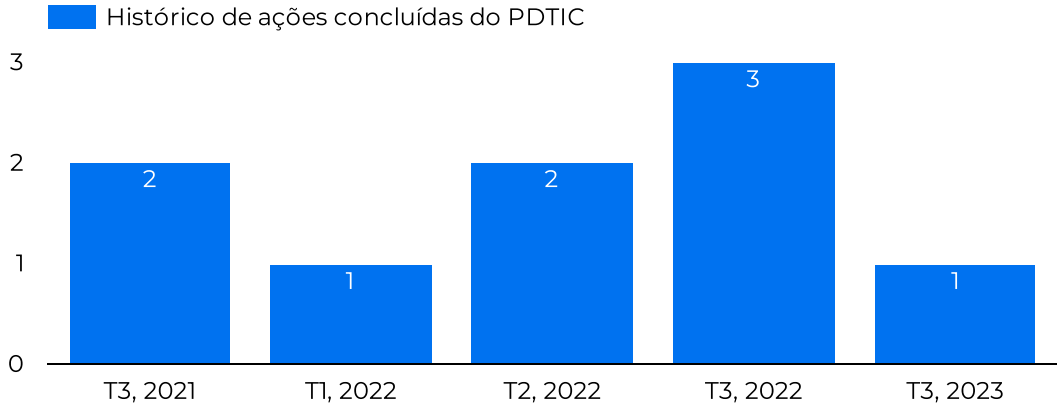



ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo ① ^	Status
CORP-13	Demanda interna	Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais	Realizado em todas as Zonas. Paralelamente a essa ação, está realizando a instalação de postos em 130 municípios termos.	COUSE	30 de set. de 2023	Concluído

Monitoramento PDTIC

Governança

Área

1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023

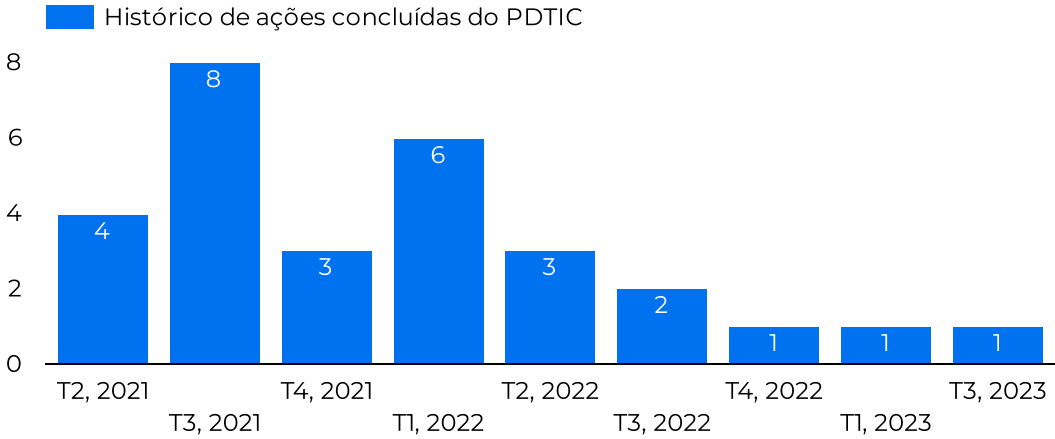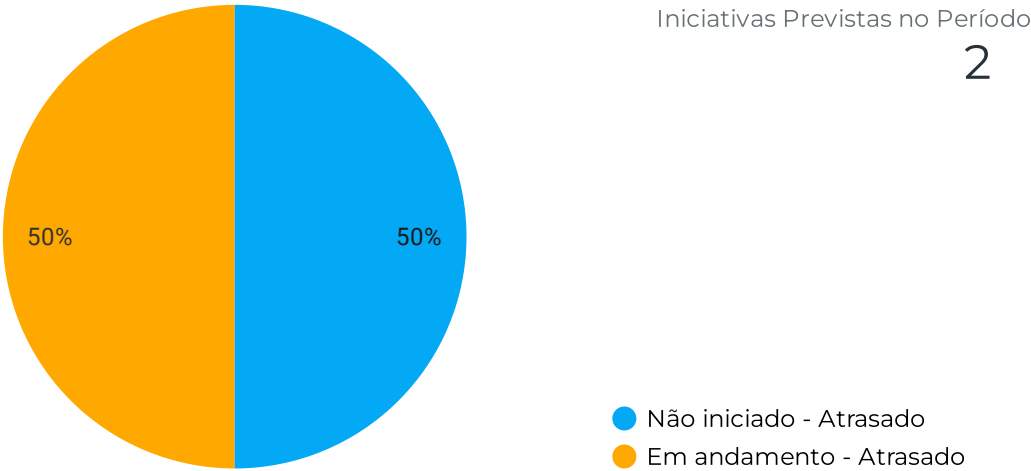

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade ②	Prazo Final ①	Status
PTE-46	Art. 27, caput, §§1º e 2º	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	Foi publicado o relatório de Gestão de Competências da STIC em ago/23. Será realizado estudo para que seja trabalhado o seu resultado.	NIC	set. de 2023	Não iniciado - Atrasado
PTE-60	ENTIC	Evolução do Processo de Contratações de TIC	- Realizada apresentação, ao CGTIC, das alterações iniciais realizadas pela Gestão anterior do Projeto; - 2ª versão do Plano Geral do Projeto apresentada e aprovada pelo CGTIC; - Aguardando a finalização da implantação do monitoramento, tendo em vista o uso dos painéis de BI	NIC	set. de 2023	Em andamento - Atrasado

Monitoramento PDTIC

Segurança


Área

1 de set. de 2023 - 30 de set. de 2023

Iniciativas Previstas no Período

O

Não há dados

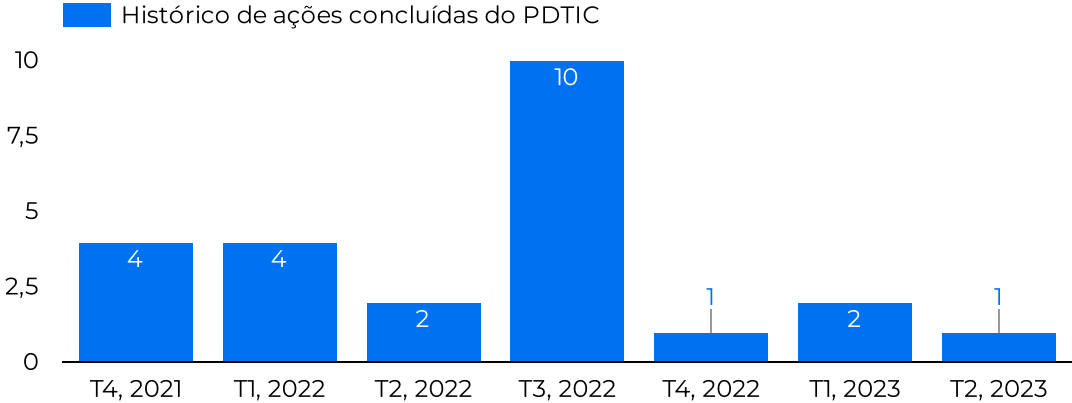

ID	Origem	Ações previstas para o período	Observações	Unidade 2 ▼	Prazo Final 1 ▲	Status
Não há dados						
