


Ações Previstas
215


Monitoramento PDTIC do TRE-MA

Ações Concluídas
123


Execução das ações

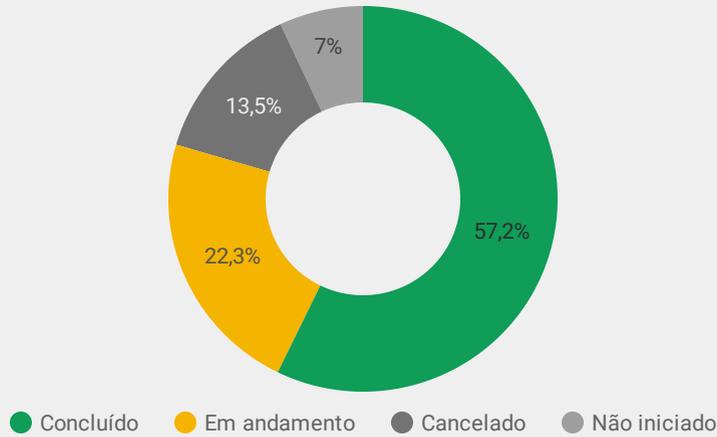

Ações Por Área

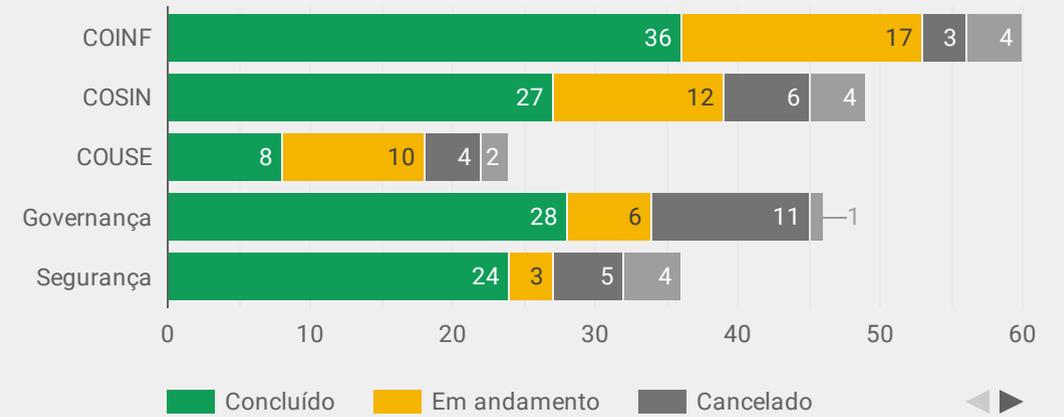


Ações Por Objetivo Estratégico

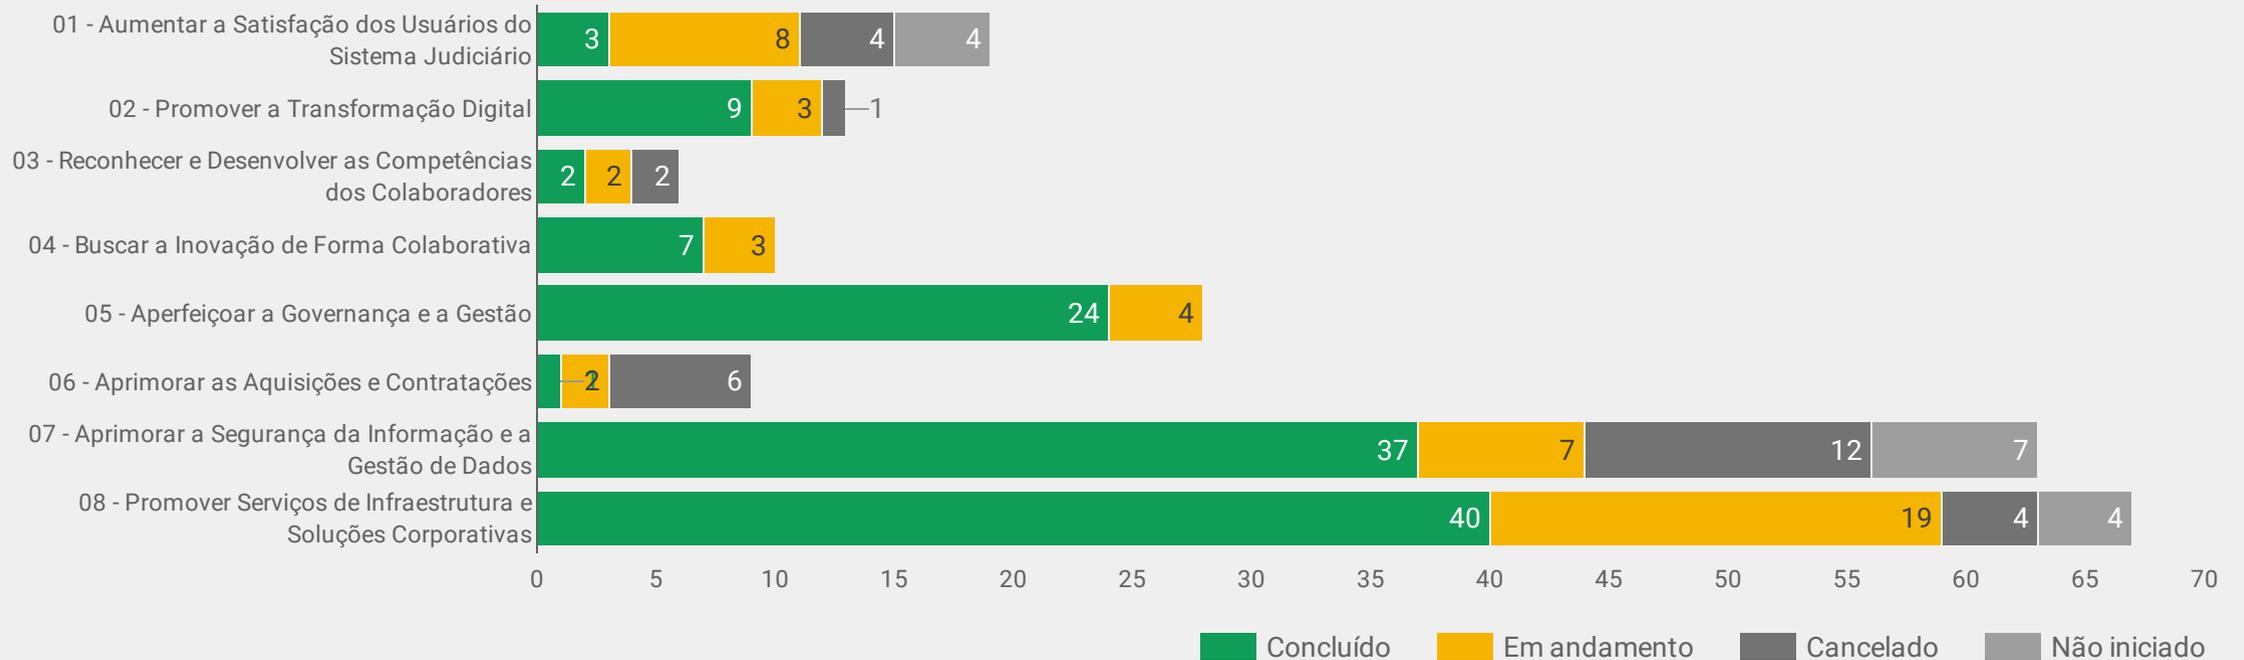


Painel de Monitoramento da Execução por Plano

Plano de Transformação Digital - PTD

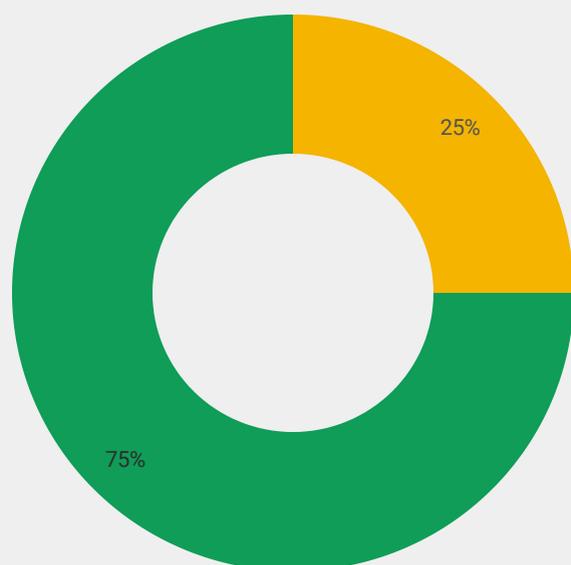


Plano de Trabalho ENTIC-JUD - PTE

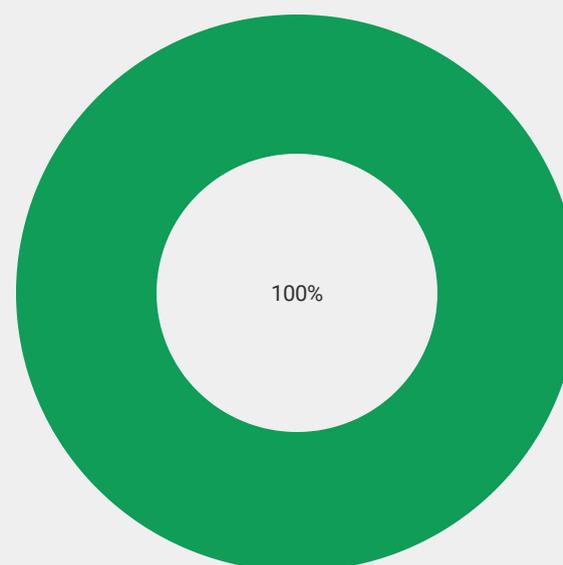

Plano de Trabalho de Segurança - PTS



Plano de Demandas Internas - PDI

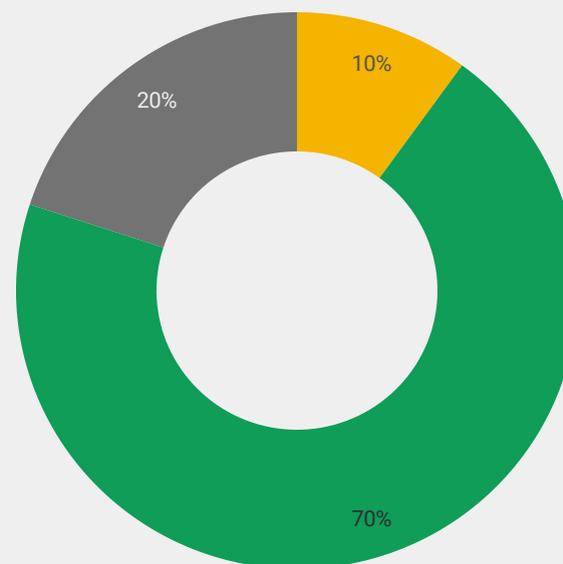

Iniciativas previstas para o período e concluídas

Previstas
17

Entregues
14

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Unidade	Prazo ▲	Conclusão	Situação
PTD-08	Implantar webservice para consulta de dados das Zonas Eleitorais	SEDIN	30 de abr. de 2023	15 de mar. de 2023	Entregue no prazo
PTD-09	Avaliar se todos os serviços da Carta de Serviços de 2º Grau possuem alternativa digital	COSIN	30 de abr. de 2023	27 de abr. de 2023	Entregue no prazo
GGES-40	Revisar painéis de monitoramento e organizar os necessários para Selo CNJ	NIC	30 de abr. de 2023	27 de mar. de 2023	Entregue no prazo
PTE-59	Reavaliar o atendimento dos itens exigidos pelo iGOV para os protocolos de segurança	SESEC	30 de abr. de 2023	26 de jun. de 2023	Entregue com atraso
INF-07	Implementar solução de criptografia de informações sensíveis do banco de dados	SEDIN	30 de abr. de 2023	27 de abr. de 2023	Entregue no prazo
PTE-37	Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação	COINF	30 de abr. de 2023	27 de abr. de 2023	Entregue no prazo
AUD-02	Realizar registro contábil dos softwares desenvolvidos internamente.	COSIN	31 de mai. de 2023	1 de fev. de 2023	Entregue no prazo
PTD-06	Implantar Modelo nacional de Interoperabilidade (MNI) no desenvolvimento de novas aplicações	COSIN	30 de jun. de 2023	30 de mar. de 2023	Entregue no prazo
INF-13	Implementar serviço de backup em fita	SERED	30 de jun. de 2023	15 de abr. de 2023	Entregue no prazo
INF-18	Implantar espelhamento de banco de dados (redundância)	SEDIN	30 de jun. de 2023	6 de jan. de 2023	Entregue no prazo
INF-23	Revisar os processos de Gerenciamento de Incidentes e Cumprimento de Requisições e adequar à metodologia vigente	SESUM	30 de jun. de 2023	30 de jun. de 2023	Entregue no prazo
INF-10	Implantar solução de correio eletrônico, colaboração e produtividade em nuvem	SERED	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	Entregue no prazo

Iniciativas previstas para o período e não concluídas

Previstas
17Pendentes
0

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade	Prazo
PTD-07	Sistema único para acompanhar todos os projetos, indicadores, ações para alavancar IGOVTIC, IGG do TCU, compras do TRE	Não há dados	COSIN	jun. de 2023
INF-22	Definir novo modelo de contratação de Serviços de Operação de Infraestrutura e Central de Serviços de TIC	Não há dados	COINF	mai. de 2023

Iniciativas canceladas

Previstas
17Canceladas
3

ID	Ações previstas para o período e não concluídas	Observações	Unidade
PTS-22	Acompanhar análise inicial do CIS-Controls pelas unidade e auxiliar na elaboração de plano de ação para atender itens	Leonardo Silva Kury Aragão Mendes • 30 de out. Em reunião na sala da STIC no dia 30/10/23 ficou decidido que essa ação será de responsabilidade da SEGIN. Ações da SEGIN não entram no PDTIC.	SESEC
GGES-21	Definir, mapear e implantar processo de suporte técnico ao processamento e operacionalização do cadastro eleitoral	Após a primeira minuta do esboço de mapeamento dessa ação, a equipe da COUSE verificou a dificuldade em se definir o escopo dessa ação, sem se confundir com o Processo da Central de Atendimento, que já define o rito para esse suporte. Ademais, cabe ressaltar que todas as operações do Sistema elo estão previstas no Manual desenvolvido pelo TSE, razão pela qual optamos pela solicitação de cancelamento dessa ação.	SEASE
GGES-23	Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação dos suprimentos de urna	Unificadas as ações GGES-22 e GGES-23, pois o processo está sendo mapeado junto.	SEMDU

Resultados-Chave

 Quantidade
16

 Atendidos
7

ID ▲	KR Tier 1	Unidade	Meta	Resultado	% da meta	Situação
KR1-1.1	Aumentar o Índice de Satisfação dos Usuários com o Suporte de TIC de 92,38% para 97%.	SESUM	97,00	97,53	100,54%	KR atingido
KR1-1.2	Aumentar o Índice de satisfação dos usuários com sistemas desenvolvidos pelo TRE-MA de 96,5% para 98,5%.	SEDIN	98,50	98,67	100,17%	KR atingido
KR1-1.3	Reduzir o índice de urnas substituídas para 1,5% até 2026.	COUSE	1,50			KR não medido
KR1-1.4	Aumentar em 3% a cada pleito o número de municípios que transmitiram todos os seus BUs até as 22h no primeiro turno.	COUSE	3,00			KR não medido
KR1-2.1	Aumentar de 43% para 100% o número de serviços digitais (1o grau) da Carta de Serviços do TRE (versão 2020) até 2026.	COSIN	100,00	100,00	100,00%	KR atingido
KR1-2.2	Atingir 100% de execução das ações de TI do PTD do TRE/MA até 2026 previstas para o período	COSIN	100,00	78,00	78,00%	KR em progresso
KR1-3.1	Aumentar o percentual de servidores da STI capacitados ao ano de 39,6% para 65% em ano eleitoral e 80% em ano não eleitoral, anualmente entre 2022 e 2026.	GABSTIC	80,00	89,36	111,70%	KR atingido
KR1-3.4	Atingir 100% de servidores da STIC com licença ativa da Alura com mínimo de 40h em cursos no ciclo nov/23 a nov/24.	GABSTIC	100,00			KR não medido
KR1-5.1	Alcançar média 0,9 no Domínio de Governança e Gestão de TIC até 2026.	NIC	0,90	0,92	102,11%	KR atingido
KR1-5.5	Manter um turnover abaixo de 5% no período, anualmente, de 2021 a 2026.	SGP	5,00			KR não medido
KR1-5.6	Atingir 100% de conformidade da Resolução 370 no SNMC-CNJ	NIC	100,00	0,00	0,00%	KR em progresso
KR1-6.1	Aumentar o índice de execução do plano de contratações de TIC para 80%	GABSTIC	80,00	39,63	49,54%	KR em progresso
KR1-7.2	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção a Incidentes Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	100,00	100,00	100,00%	KR atingido
KR1-7.3	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Prevenção de Gerenciamento de Crises Cibernéticas previstos para o período.	SESEC	100,00	10,00	10,00%	KR em progresso
KR1-7.4	Implantar, até 2026, 100% dos itens do Protocolo de Investigação para Ilícitos Cibernéticos previstos para o período.	SESEC	100,00	10,00	10,00%	KR em progresso
KR1-8.6	Aumentar de 0 para 3 a quantidade de serviços em nuvem até 2023.	COINF	3,00	3,00	100,00%	KR atingido
